

Souhrn vývoje cen mezi koly

pero

Firma	aa	2	Δ aa $\rightarrow$ 2
1	129 357 679 Kč	86 155 355 Kč	43 202 324 Kč
2	131 218 889 Kč	120 948 645 Kč	10 270 244 Kč


VYHODNOCENÍ CENOVÝCH NABÍDEK

aa


Vygenerováno: 06.05.2026 18:02



1

ESOX_1469_03_D.1.1_ASŘ,SKŘ+SO110, SO111, SO112,...

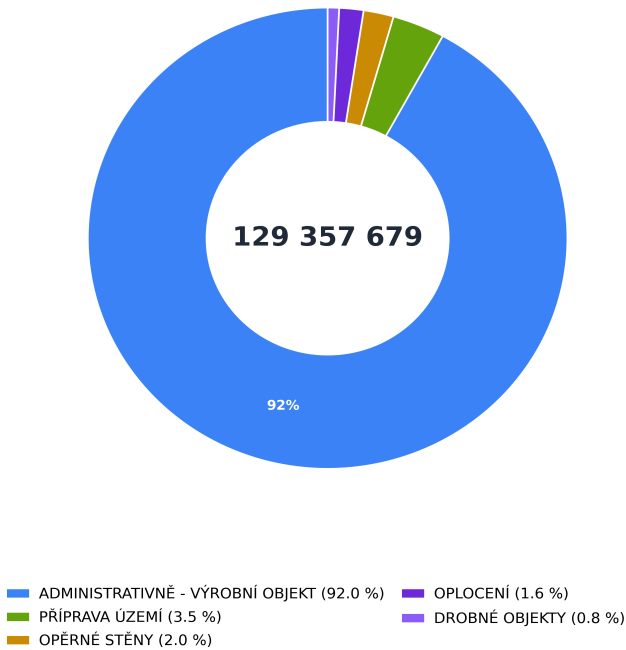

ESOX_1469_03_D.1.1_ASŘ,SKŘ+SO110, SO111, SO112,...

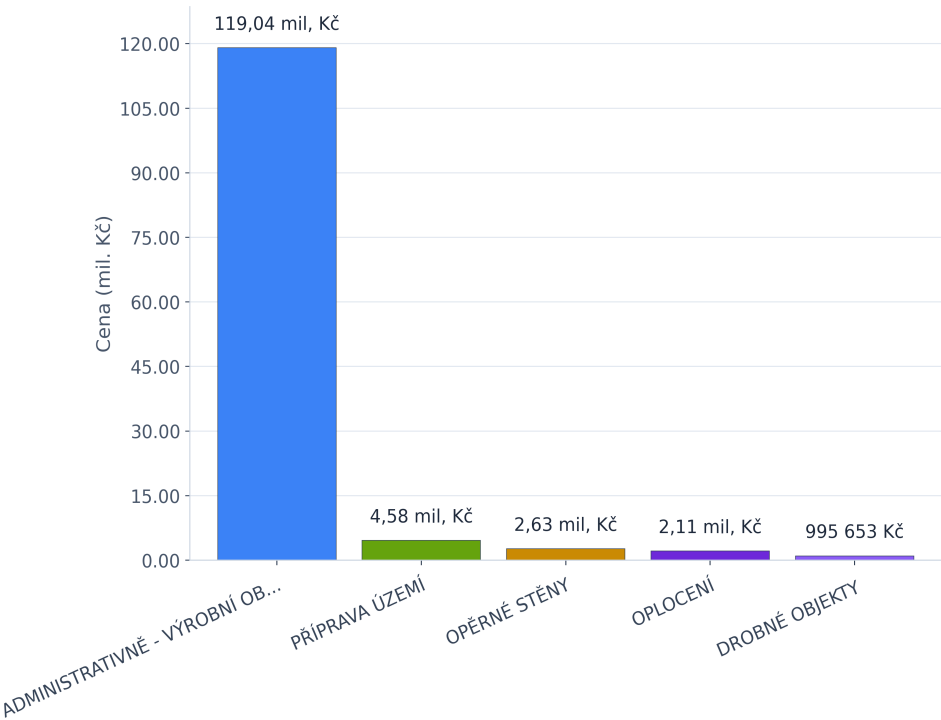

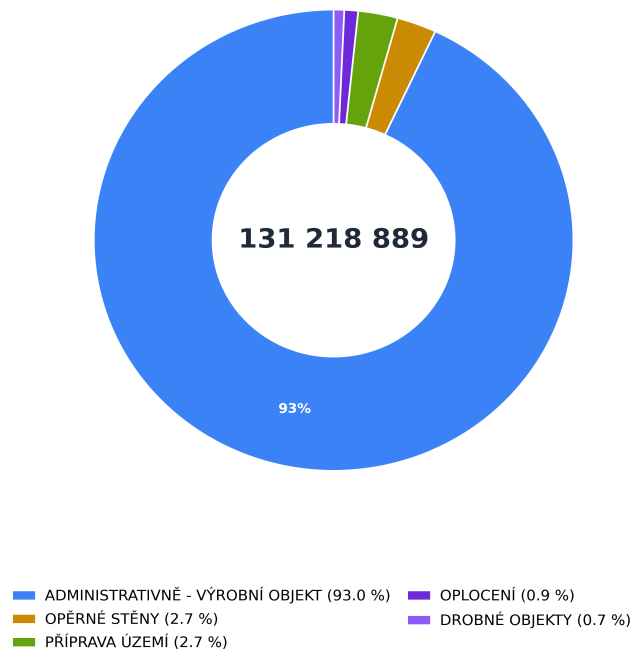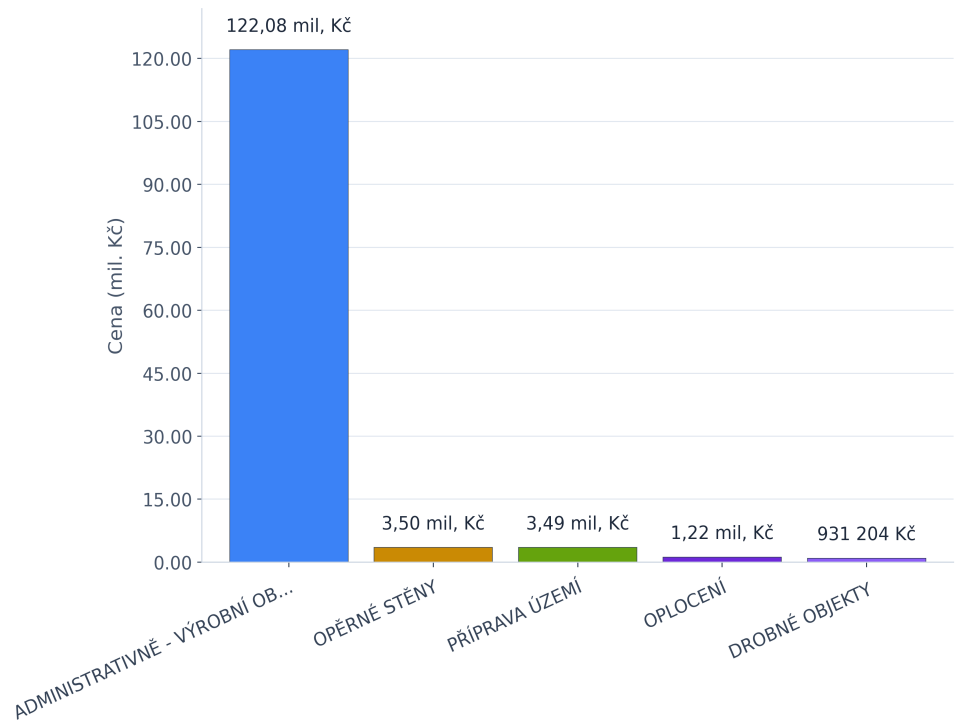IMOS_1469_03_D.1.1_ASŘ,SKŘ+SO110, SO111, SO112,...**IMOS_1469_03_D.1.1_ASŘ,SKŘ+SO110, SO111, SO112,...**

Položka	1	2
ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ OBJEKT	119 041 262 Kč	122 076 233 Kč
DROBNÉ OBJEKTY	995 653 Kč	931 204 Kč
INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ SYSTÉM	435 228 Kč	495 032 Kč
PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA	345 616 Kč	294 627 Kč
PŘÍSTŘEŠEK NA ODPAD	214 808 Kč	141 545 Kč
OPĚRNÉ STĚNY	2 625 671 Kč	3 497 895 Kč
OPĚRNÁ STĚNA OS01 - SKŘ	337 945 Kč	427 819 Kč
OPĚRNÁ STĚNA OS02 - SKŘ	261 182 Kč	326 429 Kč
OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	1 791 191 Kč	2 461 905 Kč
OPĚRNÁ STĚNA OS05 - SKŘ	235 353 Kč	281 743 Kč
OPLOCENÍ	2 114 648 Kč	1 219 693 Kč
PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	4 580 445 Kč	3 493 865 Kč
CELKEM	129 357 679 Kč	131 218 889 Kč


VYHODNOCENÍ CENOVÝCH NABÍDEK

2


Vygenerováno: 06.05.2026 18:02

2

IMOS_1469_03_D.1.1_ASŘ,SKŘ+SO110, SO111, SO112,...

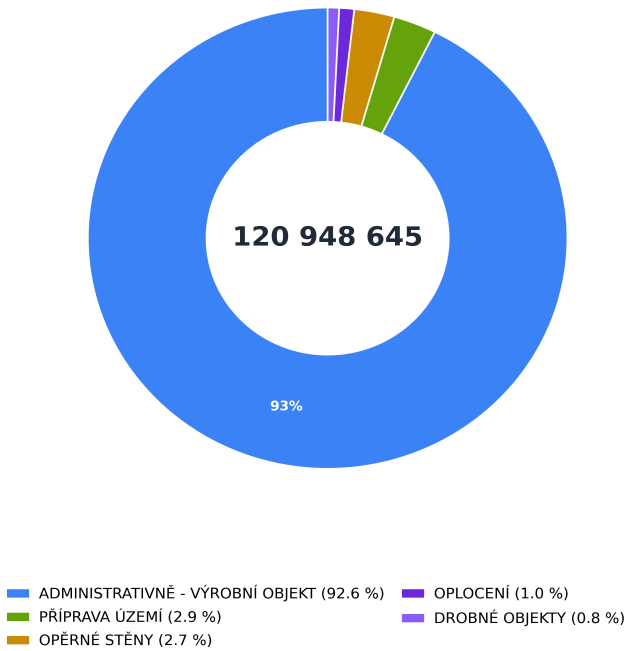


IMOS_1469_03_D.1.1_ASŘ,SKŘ+SO110, SO111, SO112,...

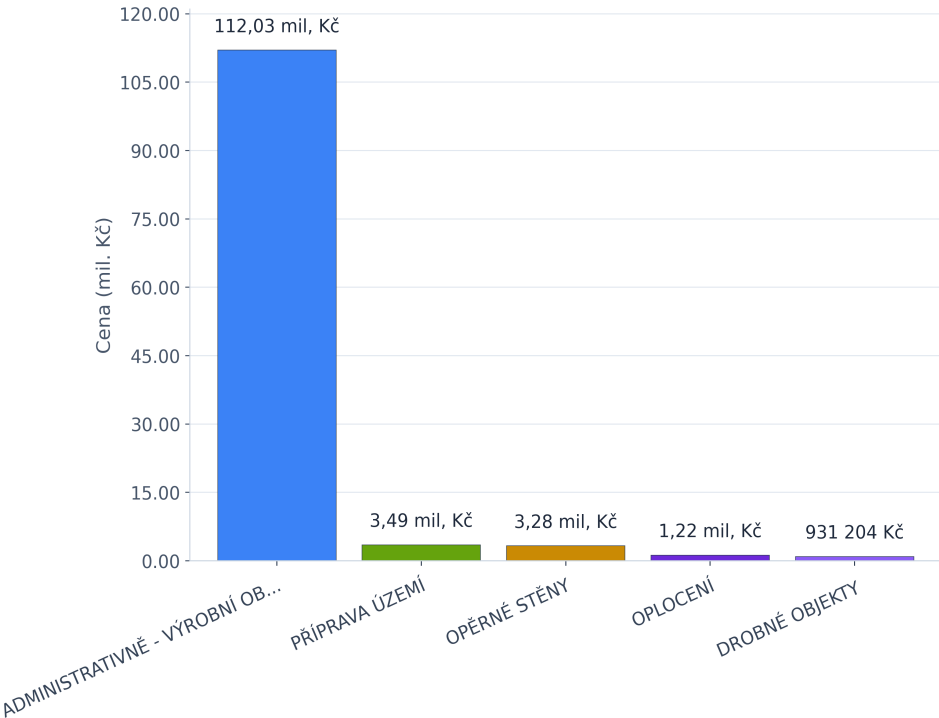


1

ESOX_1469_03_D.1.1_ASŘ,SKŘ+SO110, SO111, SO112,...

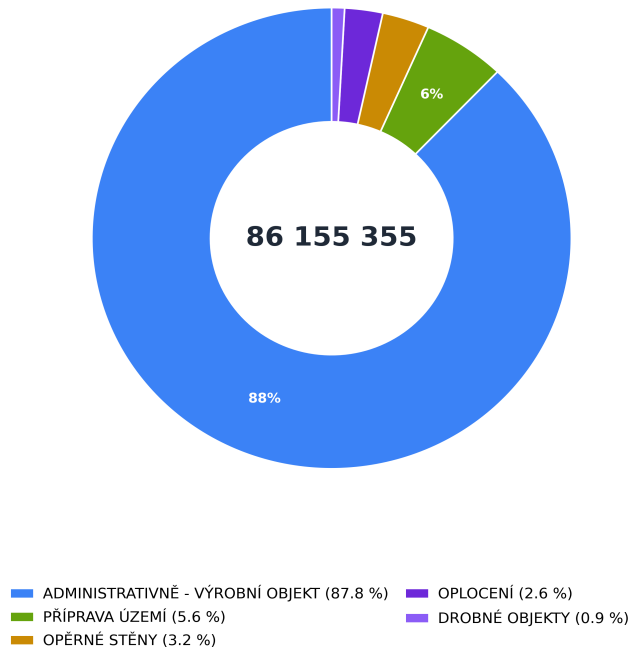

ESOX_1469_03_D.1.1_ASŘ,SKŘ+SO110, SO111, SO112,...

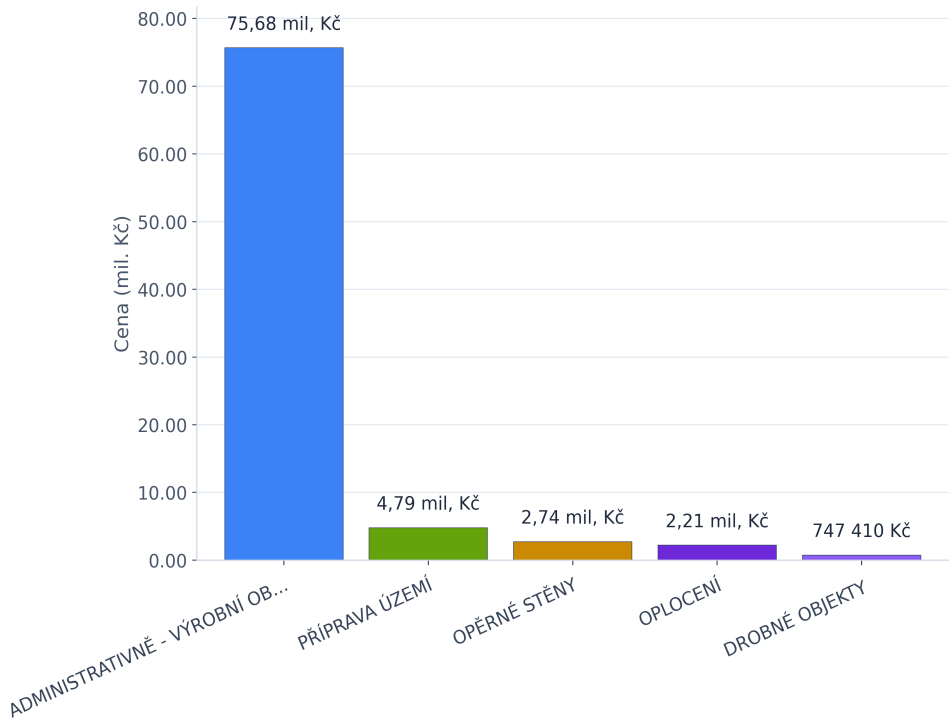

Položka	2	1
ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ OBJEKT	112 026 267 Kč	75 677 657 Kč
DROBNÉ OBJEKTY	931 204 Kč	747 410 Kč
INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ SYSTÉM	495 032 Kč	253 692 Kč
PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA	294 627 Kč	269 300 Kč
PŘÍSTŘEŠEK NA ODPAD	141 545 Kč	224 419 Kč
OPĚRNÉ STĚNY	3 277 617 Kč	2 735 667 Kč
OPĚRNÁ STĚNA OS01 - SKŘ	360 093 Kč	353 065 Kč
OPĚRNÁ STĚNA OS02 - SKŘ	277 916 Kč	272 867 Kč
OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	2 398 048 Kč	1 863 854 Kč
OPĚRNÁ STĚNA OS05 - SKŘ	241 560 Kč	245 882 Kč
OPLOCENÍ	1 219 693 Kč	2 209 254 Kč
PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	3 493 865 Kč	4 785 367 Kč
CELKEM	120 948 645 Kč	86 155 355 Kč

Položkové úspory mezi koly

1 - souhrnné úspory za objekty

Firma	Porovnané období	Objektů se snížením ceny	Součet položkových úspor	Největší jednotlivá úspora
1	aa → 2	4	43 869 700 Kč	ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ OBJEKT 43 363 605 Kč

TOP objekty podle snížení ceny mezi první a poslední nabídkou firmy

Č.	Položka	Původní kolo	Původní cena	Poslední kolo	Poslední cena	Úspora	Úspora %
SO 101	ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ OBJEKT	aa	119 041 262 Kč	2	75 677 657 Kč	43 363 605 Kč	36,4 %
SO 110	DROBNÉ OBJEKTY	aa	995 653 Kč	2	747 410 Kč	248 243 Kč	24,9 %
SO 110.1	INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ SYSTÉM	aa	435 228 Kč	2	253 692 Kč	181 536 Kč	41,7 %
SO 110.2	PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA	aa	345 616 Kč	2	269 300 Kč	76 317 Kč	22,1 %

1 - detailní úspory v položkách

Firma	Porovnané období	Detailních položek se snížením ceny	Součet položkových úspor	Největší jednotlivá úspora
1	aa → 2	40	43 106 495 Kč	D + M prvků skeletu - výrobní hala 17 744 208 Kč

TOP detailní položky podle snížení ceny mezi první a poslední nabídkou firmy

Objekt	Č.	Položka	Původní cena	Poslední cena	Úspora	Úspora %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	27	D + M prvků skeletu - výrobní hala	17 744 208 Kč	0 Kč	17 744 208 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	48	Stropy ze ŽB do bednění včetně podpěrné konstrukce z betonu C 25/30, tloušť...	3 142 018 Kč	0 Kč	3 142 018 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	1	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	2 780 955 Kč	0 Kč	2 780 955 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	47	Stropy montované z panelů stropních železobetonových vylehčených předpjatýc...	2 119 612 Kč	0 Kč	2 119 612 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	116	D + M Střešních světlíků 12000*2000, kompletně dle PD	1 986 000 Kč	0 Kč	1 986 000 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	26	Stěny ŽB z betonu C 25/30, vč.bednění, výztuž 120 kg/m3	1 678 248 Kč	0 Kč	1 678 248 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	15	Výztuž pilot betonových do země z oceli 10505 (R)	1 602 170 Kč	0 Kč	1 602 170 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	73	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	3 168 389 Kč	1 655 069 Kč	1 513 320 Kč	47,8 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	14	Výplň pilot z vodotěsného betonu prostého beton XA1, bez suspenze	1 241 351 Kč	0 Kč	1 241 351 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	8	Piloty vrtané vytažení výpažnice, výplň ŽB, D 900 mm	1 216 499 Kč	0 Kč	1 216 499 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	46	Strop ze železobetonu beton C 25/30, tl. 25 cm, bednění, výztuž 150 kg/m3,...	937 320 Kč	0 Kč	937 320 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	19	Vrty velkopřůměrové zapažené, svislé průměr přes 850 do 1050 mm, hloubka od...	840 222 Kč	0 Kč	840 222 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	29	Pr - PRŮVLAKY	831 904 Kč	0 Kč	831 904 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	104	D + M Prosklených stěn s dveřmi, kompletně dle PD	2 498 899 Kč	1 740 464 Kč	758 435 Kč	30,4 %

Objekt	Č.	Položka	Původní cena	Poslední cena	Úspora	Úspora %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	111	D + M Vnější výplně otvoru - okna v sendvičových panelech, kompletně dle PD	3 128 629 Kč	2 542 244 Kč	586 385 Kč	18,7 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	30	S - SLOUPY	486 472 Kč	0 Kč	486 472 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	25	Sloupy a pilíře ze železobetonu čtyřhranné včetně bednění a výztuže z beton...	475 668 Kč	0 Kč	475 668 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	18	Vrty velkopřůměrové zapažené, svislé průměr přes 550 do 650 mm, hloubka od...	388 731 Kč	0 Kč	388 731 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	31	ST - Stěny	326 740 Kč	0 Kč	326 740 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	66	Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV	1 200 000 Kč	877 580 Kč	322 420 Kč	26,9 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	4	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 50 m	304 709 Kč	0 Kč	304 709 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	121	Podlahy povlakové podlahovina heterogenní protiskluzná, tl. 3,3 mm, z pásů,...	1 505 891 Kč	1 258 610 Kč	247 281 Kč	16,4 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	7	Štěrkopískový pilíř	241 835 Kč	0 Kč	241 835 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	17	Zřízení výplně pilot ze ŽB s ponecháním pažnic hloubka do 10 m, průměr přes...	206 370 Kč	0 Kč	206 370 Kč	100,0 %
SO 110.1 - INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ...	17	D + M informačního totemu, vč. základových patek	384 800 Kč	201 008 Kč	183 792 Kč	47,8 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	33	D + M prefa - zednické přípomoci - 0,25% HSV, malty, kapsy, betony na podli...	150 000 Kč	0 Kč	150 000 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	32	ZT - ztužidla	146 880 Kč	0 Kč	146 880 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	68	Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních,...	476 358 Kč	373 252 Kč	103 106 Kč	21,6 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	16	Zřízení výplně pilot ze ŽB s ponecháním pažnic hloubka do 10 m, průměr přes...	88 853 Kč	0 Kč	88 853 Kč	100,0 %
SO 110.2 - PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA	17	D + M Přístřešek na kola	250 996 Kč	170 446 Kč	80 550 Kč	32,1 %

Kompletní detailní položkové úspory - 1

Objekt	Č.	Položka	Původní cena	Poslední cena	Úspora	Úspora %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	27	D + M prvků skeletu - výrobní hala	17 744 208 Kč	0 Kč	17 744 208 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	48	Stropy ze ŽB do bednění včetně podpěrné konstrukce z betonu C 25/30, tloušťky 200 mm, výztu...	3 142 018 Kč	0 Kč	3 142 018 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	1	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	2 780 955 Kč	0 Kč	2 780 955 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	47	Stropy montované z panelů stropních železobetonových vylehčených předpjatých, tloušťky 200...	2 119 612 Kč	0 Kč	2 119 612 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	116	D + M Střešních světlíků 12000*2000, kompletně dle PD	1 986 000 Kč	0 Kč	1 986 000 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	26	Stěny ŽB z betonu C 25/30, vč.bednění, výztuž 120 kg/m3	1 678 248 Kč	0 Kč	1 678 248 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	15	Výztuž pilot betonových do země z oceli 10505 (R)	1 602 170 Kč	0 Kč	1 602 170 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	73	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	3 168 389 Kč	1 655 069 Kč	1 513 320 Kč	47,8 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	14	Výplň pilot z vodostavebního betonu prostého beton XA1, bez suspenze	1 241 351 Kč	0 Kč	1 241 351 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	8	Piloty vrtané vytažení výpažnice, výplň ŽB, D 900 mm	1 216 499 Kč	0 Kč	1 216 499 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	46	Strop ze železobetonu beton C 25/30, tl. 25 cm, bednění, výztuž 150 kg/m3, podpěrná konstrukce	937 320 Kč	0 Kč	937 320 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	19	Vrty velkopřůměrové zapažené, svislé průměr přes 850 do 1050 mm, hloubka od 0 do 10 m, horn...	840 222 Kč	0 Kč	840 222 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	29	Pr - PRŮVLAKY	831 904 Kč	0 Kč	831 904 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	104	D + M Prosklených stěn s dveřmi, kompletně dle PD	2 498 899 Kč	1 740 464 Kč	758 435 Kč	30,4 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	111	D + M Vnější výplně otvoru - okna v sendvičových panelech, kompletně dle PD	3 128 629 Kč	2 542 244 Kč	586 385 Kč	18,7 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	30	S - SLOUPY	486 472 Kč	0 Kč	486 472 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	25	Sloupy a pilíře ze železobetonu čtyřhranné včetně bednění a výztuže z betonu C 25/30, rozmě...	475 668 Kč	0 Kč	475 668 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	18	Vrty velkopřůměrové zapažené, svislé průměr přes 550 do 650 mm, hloubka od 0 do 10 m, horní...	388 731 Kč	0 Kč	388 731 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	31	ST - Stěny	326 740 Kč	0 Kč	326 740 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	66	Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV	1 200 000 Kč	877 580 Kč	322 420 Kč	26,9 %

Objekt	Č.	Položka	Původní cena	Poslední cena	Úspora	Úspora %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	4	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 50 m	304 709 Kč	0 Kč	304 709 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	121	Podlahy povlakové podlahovina heterogenní protiskluzná, tl. 3,3 mm, z pásů, včetně soklíku,...	1 505 891 Kč	1 258 610 Kč	247 281 Kč	16,4 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	7	Štěrkopískový pilíř	241 835 Kč	0 Kč	241 835 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	17	Zřízení výplně pilot ze ŽB s ponecháním pažnic hloubka do 10 m, průměr přes 650 do 1250 mm	206 370 Kč	0 Kč	206 370 Kč	100,0 %
SO 110.1 - INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ...	17	D + M informačního totemu, vč. základových patek	384 800 Kč	201 008 Kč	183 792 Kč	47,8 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	33	D + M prefa - zednické přípomoci - 0,25% HSV, malty, kapsy, betony na podlití, ložiska, trn...	150 000 Kč	0 Kč	150 000 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	32	ZT - ztužidla	146 880 Kč	0 Kč	146 880 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	68	Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, g...	476 358 Kč	373 252 Kč	103 106 Kč	21,6 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	16	Zřízení výplně pilot ze ŽB s ponecháním pažnic hloubka do 10 m, průměr přes 450 do 650 mm	88 853 Kč	0 Kč	88 853 Kč	100,0 %
SO 110.2 - PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA	17	D + M Přístřešek na kola	250 996 Kč	170 446 Kč	80 550 Kč	32,1 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	114	D + M Vnější výplně otvoru - dveře 900-1350/2350 - hala, kompletně dle PD	528 305 Kč	459 951 Kč	68 355 Kč	12,9 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	117	D + M Střešních světlíků 6000*2000, kompletně dle PD	67 200 Kč	0 Kč	67 200 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	24	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30	66 600 Kč	0 Kč	66 600 Kč	100,0 %
SO 111.3 - OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	7	Železobeton základových pasů vodostavební C 25/30, XF2, XC4, XD1	185 038 Kč	136 869 Kč	48 169 Kč	26,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	67	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí...	204 361 Kč	160 128 Kč	44 233 Kč	21,6 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	112	D + M Vstupní posuvné dveře 3.np - 5300*2650, kompletně dle PD	315 310 Kč	274 514 Kč	40 796 Kč	12,9 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	113	D + M Vstupní dveře 1.np - 3675/2400, kompletně dle PD	145 035 Kč	126 270 Kč	18 765 Kč	12,9 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	102	D + M interiérové okno 3000/1250 - PO odolnost, kompletně dle PD	78 871 Kč	68 666 Kč	10 205 Kč	12,9 %
SO 111.3 - OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	14	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	43 461 Kč	37 933 Kč	5 528 Kč	12,7 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	28	PO - Podestový nosník	4 590 Kč	0 Kč	4 590 Kč	100,0 %

2 - souhrnné úspory za objekty

Firma	Porovnané období	Objektů se snížením ceny	Součet položkových úspor	Největší jednotlivá úspora
2	aa → 2	6	10 490 522 Kč	ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ OBJEKT 10 049 966 Kč

TOP objekty podle snížení ceny mezi první a poslední nabídkou firmy

Č.	Položka	Původní kolo	Původní cena	Poslední kolo	Poslední cena	Úspora	Úspora %
SO 101	ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ OBJEKT	aa	122 076 233 Kč	2	112 026 267 Kč	10 049 966 Kč	8,2 %
SO 111	OPĚRNÉ STĚNY	aa	3 497 895 Kč	2	3 277 617 Kč	220 278 Kč	6,3 %
SO 111.1	OPĚRNÁ STĚNA OS01 - SKŘ	aa	427 819 Kč	2	360 093 Kč	67 726 Kč	15,8 %
SO 111.3	OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	aa	2 461 905 Kč	2	2 398 048 Kč	63 857 Kč	2,6 %
SO 111.2	OPĚRNÁ STĚNA OS02 - SKŘ	aa	326 429 Kč	2	277 916 Kč	48 512 Kč	14,9 %
SO 111.5	OPĚRNÁ STĚNA OS05 - SKŘ	aa	281 743 Kč	2	241 560 Kč	40 183 Kč	14,3 %

2 - detailní úspory v položkách

Firma	Porovnané období	Detailních položek se snížením ceny	Součet položkových úspor	Největší jednotlivá úspora
2	aa → 2	42	12 030 468 Kč	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Kata... 3 548 268 Kč

TOP detailní položky podle snížení ceny mezi první a poslední nabídkou firmy

Objekt	Č.	Položka	Původní cena	Poslední cena	Úspora	Úspora %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	1	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	3 548 268 Kč	0 Kč	3 548 268 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	3	Odkopávky a prokopávky odkopávky nezapažené v hornině 1-4_x000D_ naložení,...	3 276 530 Kč	0 Kč	3 276 530 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	73	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	2 104 330 Kč	1 207 890 Kč	896 440 Kč	42,6 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	46	Strop ze železobetonu beton C 25/30, tl. 25 cm, bednění, výztuž 150 kg/m3,...	825 715 Kč	0 Kč	825 715 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	19	Vrty velkopřůměrové zapažené, svislé průměr přes 850 do 1050 mm, hloubka od...	1 611 865 Kč	929 100 Kč	682 765 Kč	42,4 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	33	D + M prefa - zednické přípomoci - 0,25% HSV, malty, kapsy, betony na podli...	1 000 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	50,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	48	Stropy ze ŽB do bednění včetně podpěrné konstrukce z betonu C 25/30, tloušť...	2 521 493 Kč	2 023 551 Kč	497 942 Kč	19,7 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	27	D + M prvků skeletu - výrobní hala	12 619 743 Kč	12 181 801 Kč	437 942 Kč	3,5 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	31	ST - Stěny	759 209 Kč	448 380 Kč	310 829 Kč	40,9 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	49	Kompletní konstrukce schodišť železobetonových ocelové zábradlí, dřev. madl...	888 916 Kč	700 980 Kč	187 936 Kč	21,1 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	18	Vrty velkopřůměrové zapažené, svislé průměr přes 550 do 650 mm, hloubka od...	684 760 Kč	544 000 Kč	140 760 Kč	20,6 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	30	S - SLOUPY	733 294 Kč	616 830 Kč	116 463 Kč	15,9 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	29	Pr - PRŮVLAKY	1 219 076 Kč	1 137 439 Kč	81 638 Kč	6,7 %
SO 111.3 - OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	24	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	243 707 Kč	162 500 Kč	81 207 Kč	33,3 %

Objekt	Č.	Položka	Původní cena	Poslední cena	Úspora	Úspora %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	47	Stropy montované z panelů stropních železobetonových vylehčených předpjatýc...	1 902 518 Kč	1 823 384 Kč	79 135 Kč	4,2 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	12	Poplatek za skládku drnu	291 586 Kč	240 845 Kč	50 741 Kč	17,4 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	21	Odbourání hlav pilot - odbourání hlav pilot po přebetonování až na úroveň z...	275 000 Kč	227 500 Kč	47 500 Kč	17,3 %
SO 111.1 - OPĚRNÁ STĚNA OS01 - SKŘ	8	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	94 280 Kč	62 864 Kč	31 416 Kč	33,3 %
SO 111.1 - OPĚRNÁ STĚNA OS01 - SKŘ	4	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, ,	93 298 Kč	62 864 Kč	30 434 Kč	32,6 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	22	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakterist...	465 207 Kč	437 626 Kč	27 581 Kč	5,9 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	13	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku_x000D_...	136 629 Kč	112 853 Kč	23 776 Kč	17,4 %
SO 111.2 - OPĚRNÁ STĚNA OS02 - SKŘ	8	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	68 862 Kč	45 916 Kč	22 946 Kč	33,3 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	10	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do...	123 621 Kč	102 109 Kč	21 512 Kč	17,4 %
SO 111.2 - OPĚRNÁ STĚNA OS02 - SKŘ	4	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, ,	65 473 Kč	44 116 Kč	21 358 Kč	32,6 %
SO 111.5 - OPĚRNÁ STĚNA OS05 - SKŘ	4	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, ,	61 984 Kč	41 764 Kč	20 219 Kč	32,6 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	11	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatý...	97 640 Kč	80 649 Kč	16 991 Kč	17,4 %
SO 111.5 - OPĚRNÁ STĚNA OS05 - SKŘ	8	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	49 450 Kč	32 972 Kč	16 477 Kč	33,3 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	51	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny...	149 998 Kč	141 105 Kč	8 893 Kč	5,9 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	50	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzn...	99 841 Kč	93 922 Kč	5 919 Kč	5,9 %
SO 111.1 - OPĚRNÁ STĚNA OS01 - SKŘ	12	Dopřesnění realizační dokumentace, 7% z IN	26 227 Kč	21 898 Kč	4 329 Kč	16,5 %

Kompletní detailní položkové úspory - 2

Objekt	Č.	Položka	Původní cena	Poslední cena	Úspora	Úspora %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	1	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	3 548 268 Kč	0 Kč	3 548 268 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	3	Odkopávky a prokopávky odkopávky nezapažené v hornině 1-4_x000D_ naložení,odvoz 10 000 m,...	3 276 530 Kč	0 Kč	3 276 530 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	73	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	2 104 330 Kč	1 207 890 Kč	896 440 Kč	42,6 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	46	Strop ze železobetonu beton C 25/30, tl. 25 cm, bednění, výztuž 150 kg/m3, podpěrná konstrukce	825 715 Kč	0 Kč	825 715 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	19	Vrty velkopřůměrové zapažené, svislé průměr přes 850 do 1050 mm, hloubka od 0 do 10 m, horn...	1 611 865 Kč	929 100 Kč	682 765 Kč	42,4 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	33	D + M prefa - zednické přípomoci - 0,25% HSV, malty, kapsy, betony na podlití, ložiska, trn...	1 000 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	50,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	48	Stropy ze ŽB do bednění včetně podpěrné konstrukce z betonu C 25/30, tloušťky 200 mm, výztu...	2 521 493 Kč	2 023 551 Kč	497 942 Kč	19,7 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	27	D + M prvků skeletu - výrobní hala	12 619 743 Kč	12 181 801 Kč	437 942 Kč	3,5 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	31	ST - Stěny	759 209 Kč	448 380 Kč	310 829 Kč	40,9 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	49	Kompletní konstrukce schodišť železobetonových ocelové zábradlí, dřev. madlo, PVC krytina,...	888 916 Kč	700 980 Kč	187 936 Kč	21,1 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	18	Vrty velkopřůměrové zapažené, svislé průměr přes 550 do 650 mm, hloubka od 0 do 10 m, horní...	684 760 Kč	544 000 Kč	140 760 Kč	20,6 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	30	S - SLOUPY	733 294 Kč	616 830 Kč	116 463 Kč	15,9 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	29	Pr - PRŮVLAKY	1 219 076 Kč	1 137 439 Kč	81 638 Kč	6,7 %
SO 111.3 - OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	24	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	243 707 Kč	162 500 Kč	81 207 Kč	33,3 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	47	Stropy montované z panelů stropních železobetonových vylehčených předpjatých, tloušťky 200...	1 902 518 Kč	1 823 384 Kč	79 135 Kč	4,2 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	12	Poplatek za skládku drnu	291 586 Kč	240 845 Kč	50 741 Kč	17,4 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	21	Odbourání hlav pilot - odbourání hlav pilot po přebetonování až na úroveň zdravého betonu,...	275 000 Kč	227 500 Kč	47 500 Kč	17,3 %
SO 111.1 - OPĚRNÁ STĚNA OS01 - SKŘ	8	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	94 280 Kč	62 864 Kč	31 416 Kč	33,3 %
SO 111.1 - OPĚRNÁ STĚNA OS01 - SKŘ	4	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, ,	93 298 Kč	62 864 Kč	30 434 Kč	32,6 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	22	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v t...	465 207 Kč	437 626 Kč	27 581 Kč	5,9 %

Objekt	Č.	Položka	Původní cena	Poslední cena	Úspora	Úspora %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	13	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku_x000D_ do 100 m3, z h...	136 629 Kč	112 853 Kč	23 776 Kč	17,4 %
SO 111.2 - OPĚRNÁ STĚNA OS02 - SKŘ	8	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	68 862 Kč	45 916 Kč	22 946 Kč	33,3 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	10	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	123 621 Kč	102 109 Kč	21 512 Kč	17,4 %
SO 111.2 - OPĚRNÁ STĚNA OS02 - SKŘ	4	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, ,	65 473 Kč	44 116 Kč	21 358 Kč	32,6 %
SO 111.5 - OPĚRNÁ STĚNA OS05 - SKŘ	4	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, ,	61 984 Kč	41 764 Kč	20 219 Kč	32,6 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	11	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes...	97 640 Kč	80 649 Kč	16 991 Kč	17,4 %
SO 111.5 - OPĚRNÁ STĚNA OS05 - SKŘ	8	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	49 450 Kč	32 972 Kč	16 477 Kč	33,3 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	51	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	149 998 Kč	141 105 Kč	8 893 Kč	5,9 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	50	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	99 841 Kč	93 922 Kč	5 919 Kč	5,9 %
SO 111.1 - OPĚRNÁ STĚNA OS01 - SKŘ	12	Dopřesnění realizační dokumentace, 7% z IN	26 227 Kč	21 898 Kč	4 329 Kč	16,5 %
SO 111.3 - OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	28	Dopřesnění realizační dokumentace, 7% z IN	151 691 Kč	147 609 Kč	4 082 Kč	2,7 %
SO 111.2 - OPĚRNÁ STĚNA OS02 - SKŘ	12	Dopřesnění realizační dokumentace, 7% z IN	20 010 Kč	16 909 Kč	3 101 Kč	15,5 %
SO 111.5 - OPĚRNÁ STĚNA OS05 - SKŘ	12	Dopřesnění realizační dokumentace, 7% z IN	17 305 Kč	14 737 Kč	2 569 Kč	14,8 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	52	Příplatek za zabudované rohovníky	34 156 Kč	32 131 Kč	2 025 Kč	5,9 %
SO 111.1 - OPĚRNÁ STĚNA OS01 - SKŘ	11	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 1,5% z HSV	5 620 Kč	4 692 Kč	928 Kč	16,5 %
SO 111.3 - OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	27	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 1,5% z HSV	32 505 Kč	31 630 Kč	875 Kč	2,7 %
SO 111.2 - OPĚRNÁ STĚNA OS02 - SKŘ	11	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 1,5% z HSV	4 288 Kč	3 623 Kč	665 Kč	15,5 %
SO 111.1 - OPĚRNÁ STĚNA OS01 - SKŘ	10	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech profesí), 1% z HSV	3 747 Kč	3 128 Kč	618 Kč	16,5 %
SO 111.3 - OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	26	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech profesí), 1% z HSV	21 670 Kč	21 087 Kč	583 Kč	2,7 %
SO 111.5 - OPĚRNÁ STĚNA OS05 - SKŘ	11	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 1,5% z HSV	3 708 Kč	3 158 Kč	550 Kč	14,8 %
SO 111.2 - OPĚRNÁ STĚNA OS02 - SKŘ	10	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech profesí), 1% z HSV	2 859 Kč	2 416 Kč	443 Kč	15,5 %

Objekt	Č.	Položka	Původní cena	Poslední cena	Úspora	Úspora %
SO 111.5 - OPĚRNÁ STĚNA OS05 - SKŘ	10	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech profesí), 1% z HSV	2 472 Kč	2 105 Kč	367 Kč	14,8 %
